



Le calendrier

Publié le 31/07/2023 - Mis à jour le 16/01/2025

Les travaux seront divisés en cinq phases, selon le rythme moyen d'exploitation et de libération progressive des terrains par le carrier GSM. Chaque phase de construction durera en moyenne deux ans tous les cinq ans, jusqu'en 2040.

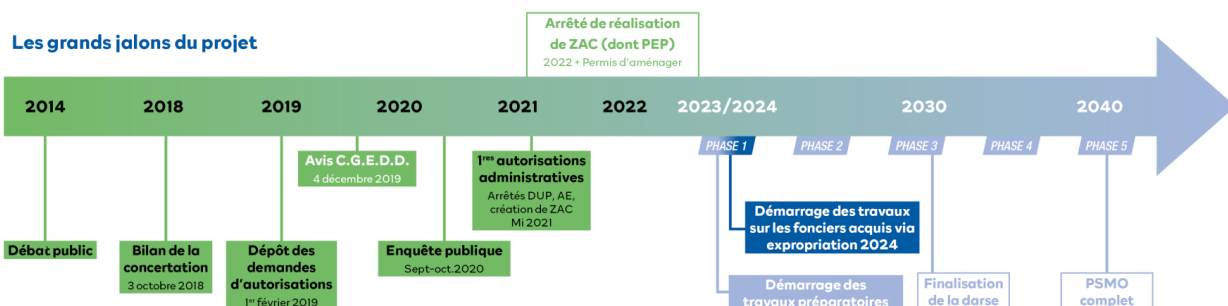

©HAROPA PORT

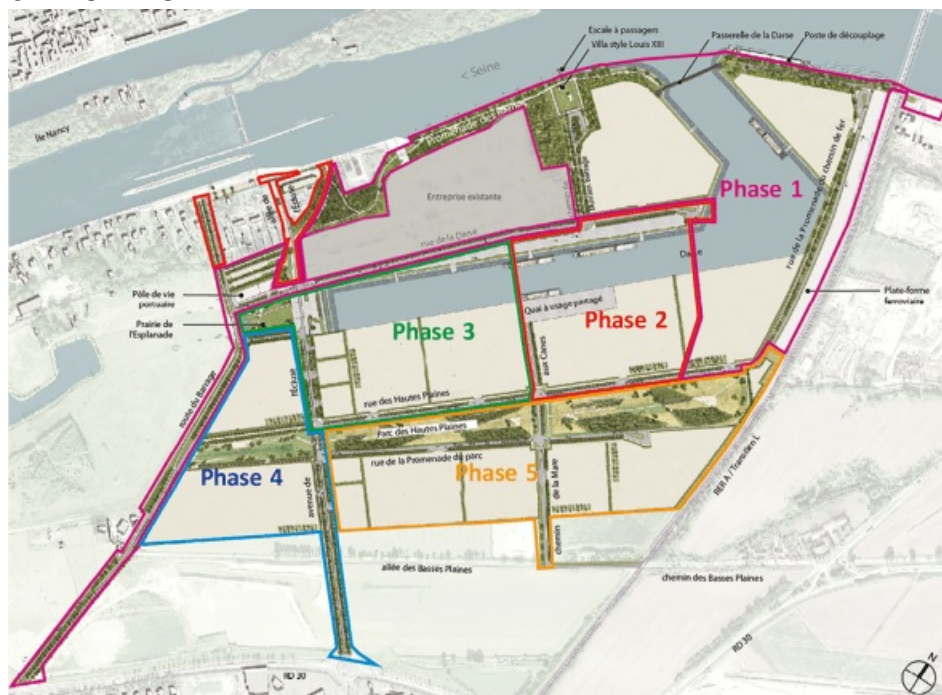

©HAROPA PORT / DR

PHASE 1 sur 34,9 ha environ

Des travaux préparatoires permettront notamment de :

- creuser l'entrée de la darse et son ouverture vers la Seine ;
- aménager les berges de la Seine ;
- aménager l'escale à passager et le poste de découplage ;
- aménager la route du Barrage et les cheminements doux.

PHASE 2 sur 14 ha environ

Cette phase de travaux permettra de :

- allonger la darse afin de proposer de nouvelles zones amodiabiles et réaliser le Quai à Usage Partagé (QUP) ;
- réaliser les cheminements doux en continuité des premières voiries ;
- poursuivre les aménagements paysagers et environnementaux.

PHASE 3 sur 14,7 ha environ

Cette phase 3 permettra de :

- finaliser la darse dans sa totalité et des quais associés ;
- réaliser les aménagements paysagers et environnementaux à l'ouest de la darse (zone humide de l'esplanade de la darse, la prairie de l'esplanade) ;
- poursuivre les aménagements et les connexions des cheminements doux.

PHASE 4 sur 10,7 ha environ

Des travaux qui permettront de :

- achever de l'avenue de l'Écluse ;
- livrer des aménagements paysagers et environnementaux ;
- poursuivre l'aménagement des cheminements doux.

PHASE 5 sur 18,1 ha environ

Cette phase permettra de :

- réaliser le Parc des Hautes Plaines et les aménagements paysagers et environnementaux ;
- livrer des dernières parcelles pour les entreprises ;
- aménager des dernières voiries ;
- finaliser les cheminements doux.

Bon à savoir

Les **travaux seront réalisés uniquement en jours ouvrés et en journée** de 7h à 20h et les entreprises chargées des travaux s'engageront à signer la **charte chantier vert** de HAROPA PORT « Pour des chantiers respectueux de l'environnement ».

Tout au long du chantier, une information régulière sera mise en œuvre à travers différents canaux. Une **instance permanente de concertation** a été mise en place à cet effet et se poursuivra tout au long de l'exploitation du port.

Vous souhaitez effectuer un signalement ? HAROPA PORT a mis en place une adresse électronique dédiée : Courriel

Calendrier des opérations de battage

B Opération de vibrofonçage / battage de duc d'albe

A Autre opération bruyante

janv-25																														
Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

févr-25																											
S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

mars-25																														
S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



71, quai Colbert, 76600 Le Havre
02 79 18 05 00
